



Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение
высшего образования
«Московский государственный технический университет
имени Н.Э. Баумана
(национальный исследовательский университет)»
(МГТУ им. Н.Э. Баумана)

ФАКУЛЬТЕТ «Информатика и системы управления»

КАФЕДРА «Программное обеспечение ЭВМ и информационные технологии»

ОТЧЕТ

к лабораторной работе №1

По курсу: «Экономика программной инженерии»

Тема: «Планирование программного проекта в

*Microsoft Project: настройка рабочей среды и создание нового
проекта»*

Студентка ИУ7-84Б
Цховребова Я.Р.
Вариант 12

Преподаватель
Барышникова М.Ю.
Силантьева А.В.

2026 г.

Задание для тренировки

Вариант 3.

Осуществить планирование проекта со следующими временными характеристиками:


Название работы	Длительность (дни)
Работа А	3
Работа В	4
Работа С	1
Работа D	4
Работа Е	5
Работа F	7
Работа G	6
Работа Н	5
Работа I	8

Дата начала проекта – 1-й рабочий день февраля текущего года.

Провести планирование работ проекта, учитывая следующие связи между задачами:

1. Предусмотреть, что D – исходная работа проекта;
2. Работа Е следует за D;
3. Работы А, G и С следуют за Е;
4. Работа В следует за А;
5. Работа Н следует за G;
6. Работа F следует за С;
7. Работа I начинается после завершения В, Н, и F.

Параметры рабочей среды использовались стандартные. По умолчанию ведется планирование с фиксированным объемом ресурсов. Период реализации проекта: с 02.02.2026 по 11.03.2026 (28 дней).

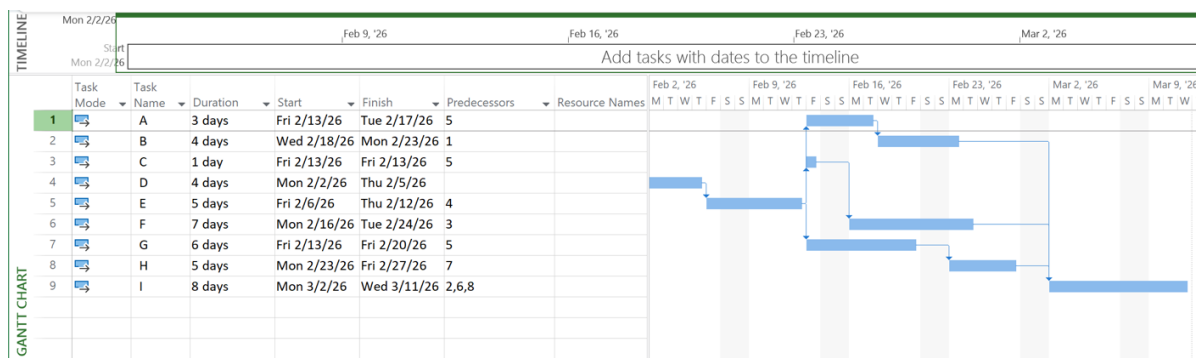

Цель работы

Целью лабораторной работы №1 является освоение возможностей программы Microsoft Project для планирования проекта по разработке программного обеспечения.

Содержание проекта: команда разработчиков из 16 человек занимается созданием карты города на основе собственного модуля отображения. Проект должен быть завершен в течение 6 месяцев. Бюджет проекта: 50 000 рублей.

1. Задание 1

На вкладке сведений о проекте выполнена дата начала проекта и стандартный календарь рабочего времени.

Project Information for 'Project1'

Start date: Sun 2/1/26 Current date: Thu 3/19/26

Finish date: Wed 3/11/26 Status date: NA

Schedule from: Project Start Date Calendar: Standard

All tasks begin as soon as possible. Priority: 500

Enterprise Custom Fields

Department:


Custom Field Name	Value
-------------------	-------

Help Statistics... OK Cancel

В настройках расписания проекта установлены: длительность работы в неделях, объем работ в часах, тип работ по умолчанию – с фиксированными трудозатратами, количество рабочих часов в день равным 8, количество рабочих часов в неделю равным 40, начало рабочей недели в понедельник, начало финансового года – в январе, продолжительность рабочего дня с 9 до 18 часов.

The screenshot shows the 'Project Options' dialog box with the 'Schedule' tab selected. The left sidebar contains options: General, Display, Schedule (selected), Proofing, Save, Language, Advanced, Customize Ribbon, Quick Access Toolbar, Add-ins, and Trust Center. The main area is titled 'Change options related to scheduling, calendars, and calculations.' and contains two sections: 'Calendar options for this project' and 'Scheduling options for this project'. The 'Calendar options' section includes: 'Calendar options for this project' (Project4), 'Week starts on' (Monday), 'Fiscal year starts in' (January), a checkbox for 'Use starting year for FY numbering' (unchecked), 'Default start time' (9:00 AM), 'Default end time' (6:00 PM), 'Hours per day' (8), 'Hours per week' (40), and 'Days per month' (20). A note explains that these times are assigned to tasks when a start or finish date is entered without a time. The 'Scheduling' section includes: a checkbox for 'Show scheduling messages' (checked), 'Show assignment units as a' (Percentage), 'Scheduling options for this project' (Project4), 'New tasks created' (Manually Scheduled), 'Auto scheduled tasks scheduled on' (Project Start Date), 'Duration is entered in' (Days), 'Work is entered in' (Hours), 'Default task type' (Fixed Work), a checkbox for 'New tasks are effort driven' (checked), and a checkbox for 'Tasks will always honor their constraint dates' (checked). 'OK' and 'Cancel' buttons are at the bottom right.

Добавлены праздничные и сокращенные дни в календарь через панель “Проект”.




Праздничные дни:


- Международный женский день – 9 марта,
- День труда – 1 мая,
- День победы – 11 мая,
- День России – 12 июня,
- День народного единства – 4 ноября.

Сокращенные дни (рабочий день с 9:00 до 17:00):


- 30 апреля,
- 8 мая,
- 11 июня,
- 3 ноября.

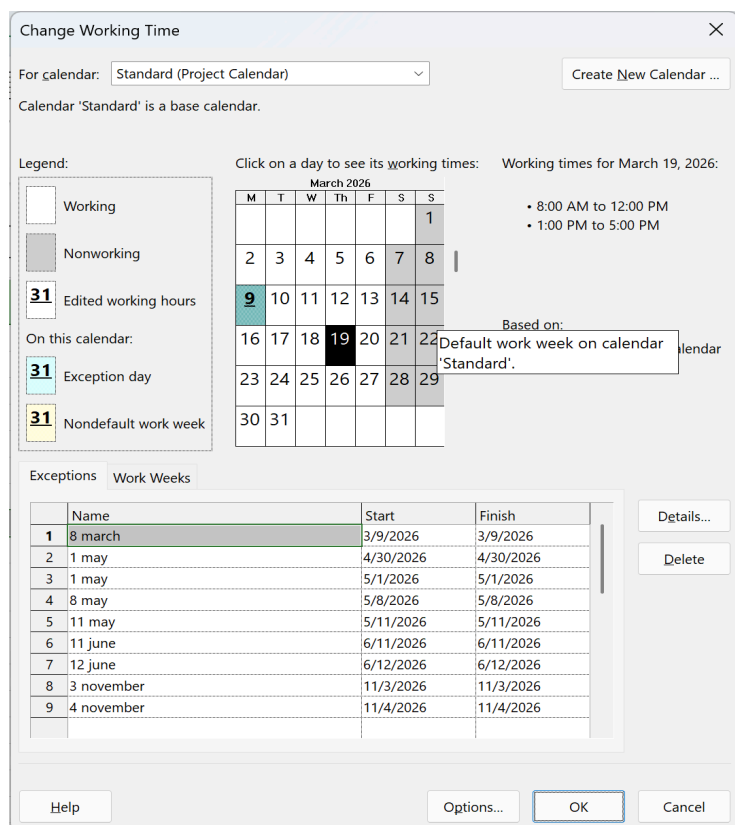

На вкладке “Формат диаграммы Ганта” панели добавлена суммарная задача проекта.



С помощью двойного нажатия на нулевую строку в рабочей области, изменено название проекта и добавлена заметка.

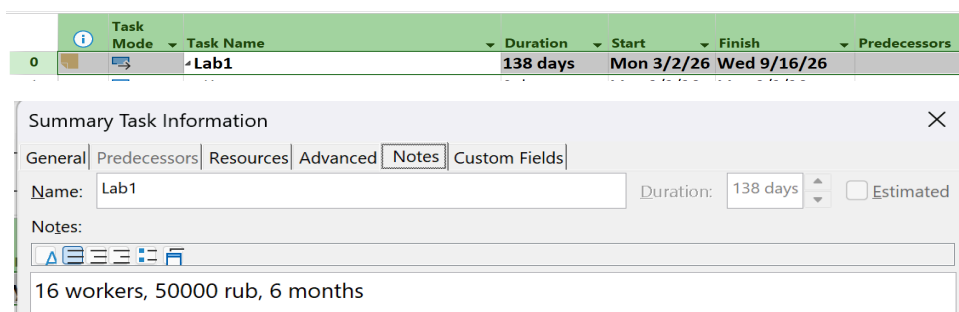


2. Задание 2

Был произведен ввод задач согласно заданию лабораторной работы.

Список задач:

Номер	Наименование	Длительность
1	Начало проекта	0
2	Создание интерфейса	1 дн.
3	Разработка дизайна интерфейса	1 дн.
4	Разработка 2D графических элементов	3 нед.
5	Разработка 3D графических элементов	2 нед.
6	Создание заставки	3 нед.
7	Программирование интерфейса	3 нед.
8	Построение базы объектов	1 дн.
9	Анализ и построение структуры базы объектов	2 нед.
10	Программирование средств обработки базы объектов	3 нед.
11	Наполнение базы объектов	12 нед.
12	Создание ядра GIS	1 дн.
13	Анализ и проектирование ядра	3 нед.
14	Создание модели ядра	5 нед.
15	Тестирование модели ядра	1 нед.
16	Создание рабочей версии ядра	10 нед.
17	Создание мультимедиа – наполнения	6 нед.
18	Создание справочной системы	2 нед.
19	Создание руководства пользователя	1 дн.
20	Разработка дизайна руководства	1 нед.
21	Написание руководства пользователя	3 нед.
22	Создание web – сайта и поддержка	1 дн.
23	Разработка структуры сайта	1 дн.
24	Разработка дизайна сайта	1 нед.
25	Наполнение сайта	3 нед.
26	Тестирование сайта	4 нед.
27	Сдача сайта в эксплуатацию	0


Введенный список задач в Microsoft Project:

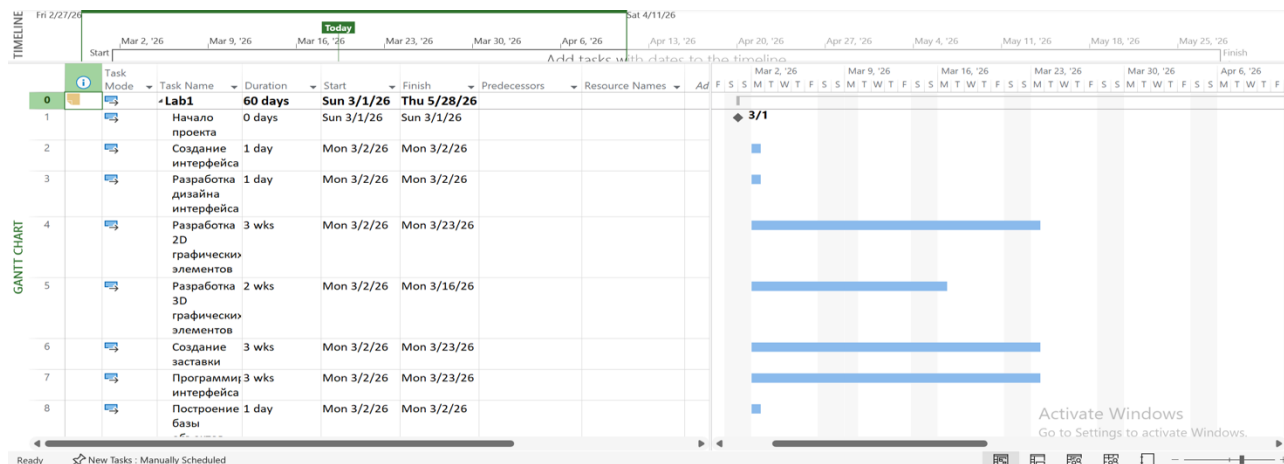


3. Задание 3

С помощью кнопки на вкладке “Задача” задачи разделены на подгруппы:

- группировка задач 3-7 как подзадач задачи 2,
- группировка задач 4-6 как подзадачи задачи 3,
- группировка задач 9-11 как подзадач задачи 8,
- группировка задач 13-16 как подзадач задачи 12,
- группировка задач 20, 21 как подзадачи задачи 19,
- группировка задач 23-25 как подзадач задачи 22.




Также был установлен автоматический режим задач.

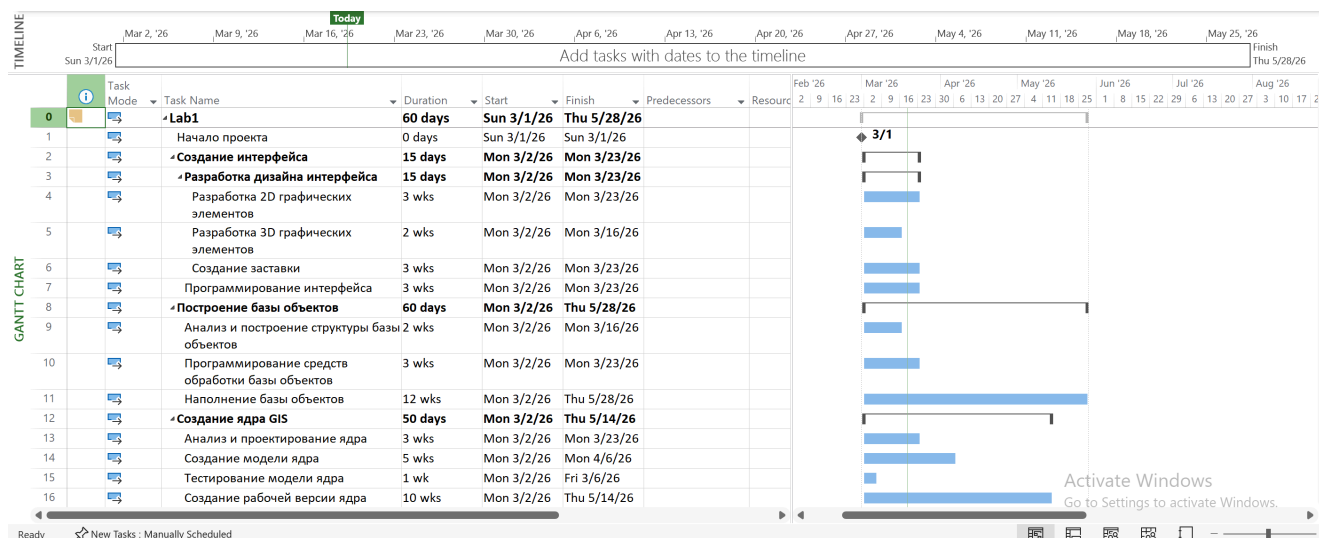

4. Задание 4

Заполнена колонка «Предшественники» согласно заданию лабораторной работы, и получен итоговый результат. В результате продолжительность проекта составляет 138 дней. Период реализации проекта: с 02.03.2026 по 16.09.2026.

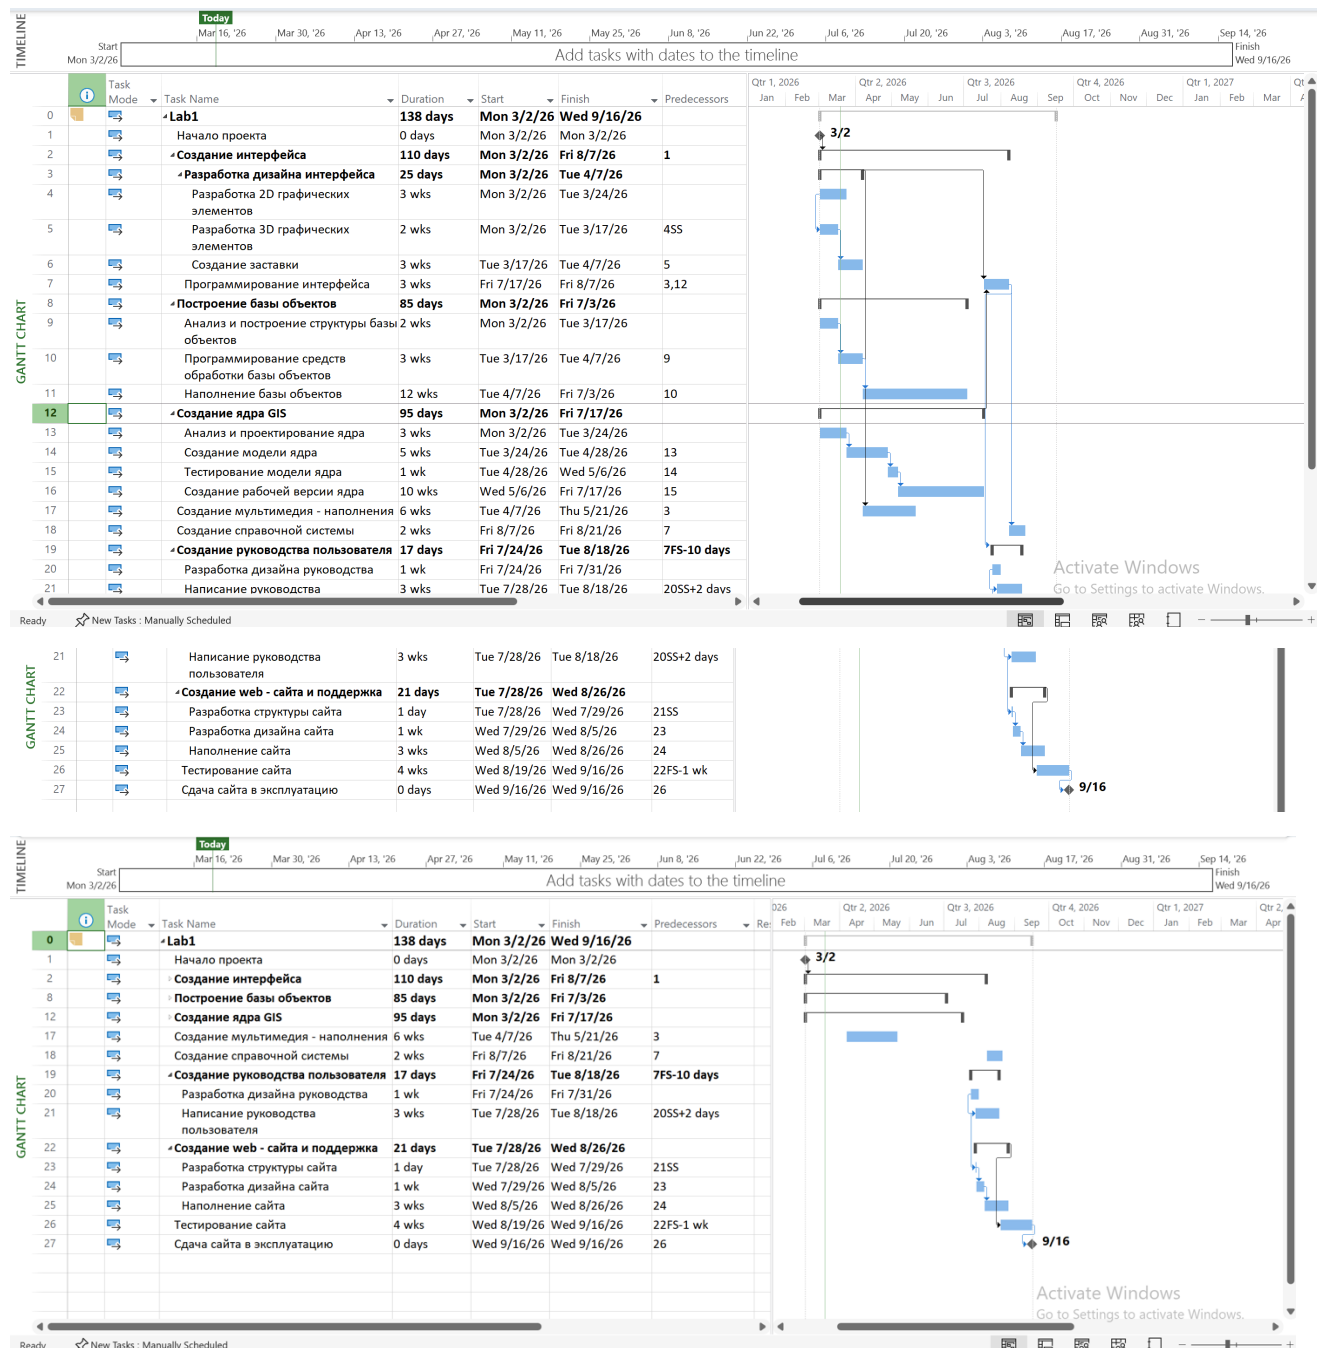

Заключение

В ходе выполнения данной лабораторной работы была изучена программа MS Project и ряд её возможностей. Была проведена настройка рабочей среды, создание списка задач, их структурирование и установление связей между ними. В результате выяснилось, что проект не укладывается в изначальные сроки (6 месяцев) – дата завершения 16.09.2026 вместо 02.09.2026.
